



Encerramento e Reequilíbrio Contratual: Trabalho-Corsan

Proposta de Posicionamento Estratégico

Uma Análise por GRAVITAS

GRAVITAS: Plano de Ação para Rescisão Contratual

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

**Proteger a
Empresa de
Cobranças**



Resguardar-se de custos de retrabalho, materiais e adiantamentos contratuais.

**Recuperar
Valores
Devidos**



Buscar pagamentos por serviços não medidos, preços incorretos e outros itens.

METODOLOGIA DE AÇÃO



1. Análise e Comprovação

Revisar medições e criar cálculos que provem que os serviços não foram pagos integralmente.



2. Notificação e Solicitação Formal


Enviar ofícios solicitando reequilíbrio de preços, paralisação dos serviços e rescisão.



3. Judicialização Imediata

Proceder com a ação judicial como passo final e definitivo da estratégia.

Sumário Executivo: Uma Encruzilhada Decisiva

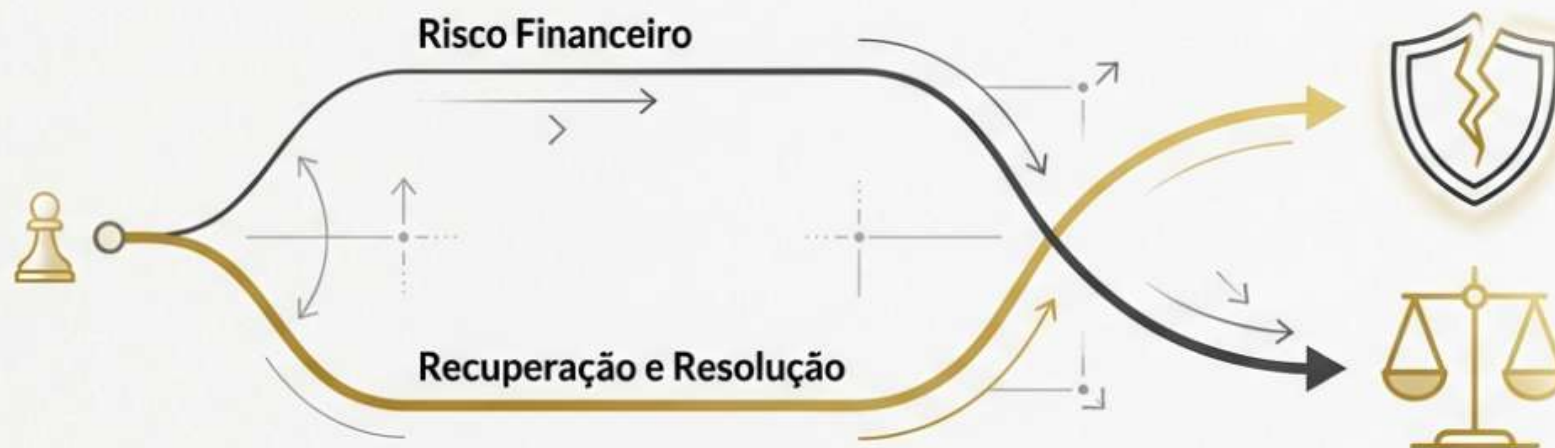

Situação Atual: O contrato com a CORSAN atingiu um ponto de insustentabilidade técnica e financeira.



Riscos Iminentes: Exposição a cobranças significativas por retrabalhos, materiais e adiantamentos contratuais.



Oportunidade Oculta: Potencial de recuperação de valores substanciais através da reanálise forense de medições e preços.



Nossa Proposta: Uma estratégia dupla para blindar a Lavoro contra perdas e executar uma contra-ofensiva para reaver o que é devido, culminando na rescisão planejada do contrato.

Mapeamento dos Riscos: A Exposição Financeira da Lavoro



Retrabalho

Cobranças por supostas não conformidades (repavimentação, trechos sem declividade ou continuidade, danos a calçadas, entre outros).



Materiais

Dívidas em aberto por materiais que foram fornecidos pela CORSAN.



Adiantamentos

Risco de execução das parcelas remanescentes do adiantamento contratual.

A Virada Estratégica: Transformando Riscos em Ativos



A mesma análise detalhada que nos protege das cobranças indevidas revela as falhas sistêmicas nos pagamentos da CORSAN. Nossa defesa é o nosso ataque.

Onde Está o Valor a Ser Recuperado?



Medições Anteriores

Análise forense para identificar serviços executados e não medidos ou medidos incorretamente.



Crítérios de Medição

Correção de metodologias de cálculo que subestimaram o volume real dos serviços.



Serviços Não Precificados


Quantificação e valoração de escopo executado fora do contrato original.



Preços Unitários

Reequilíbrio de preços defasados que não refletem os custos de execução.

A Tese Central: Por Que os Pagamentos Foram Insuficientes

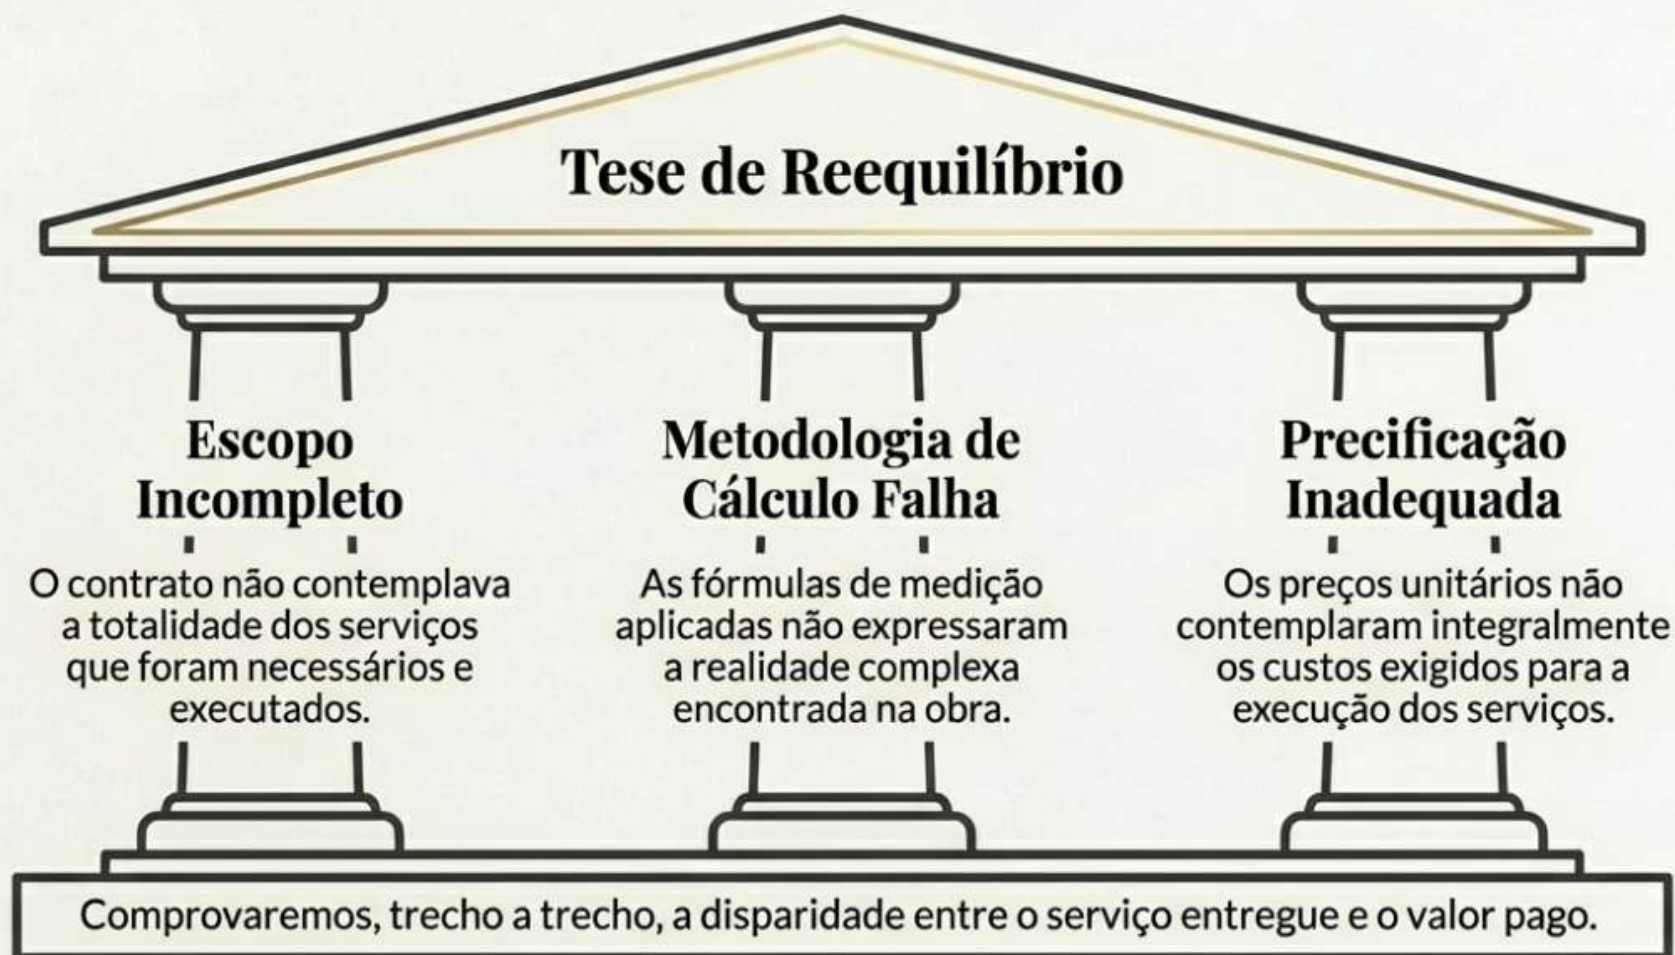

O Plano de Ação: Nossa Metodologia em 6 Etapas

Nossa abordagem é faseada e incremental. Cada etapa é projetada para construir uma base documental robusta e aumentar a nossa alavancagem negocial antes de escalar para a próxima fase.



Etapas 1 & 2: Análise Forense e Fundamentação da Tese

1



Etapa 1: Revisão de Medições

Auditar 100% do histórico de medições versus o executado. Cobrar formalmente por todos os serviços não medidos ou medidos incorretamente.

2



Etapa 2: Desenvolvimento de Cálculos

Criar laudos técnicos com novas metodologias de cálculo que comprovem que os serviços executados (trecho a trecho) não foram pagos em sua totalidade.

Etapas 3 & 4: Engajamento Formal e Defesa Ativa

3



Etapa 3: Solicitações de Reequilíbrio

Submeter múltiplas e bem-documentadas solicitações de reequilíbrio econômico-financeiro à CORSAN, criando um rastro processual robusto e inequívoco.

4



Etapa 4: Resposta a Ofícios

Responder tecnicamente a todas as solicitações de retrabalhos, conectando-as conectando-as diretamente às nossas solicitações de reequilíbrio e demonstrando a inviabilidade da execução sem a correção dos pagamentos.

Etapa 5: A Notificação Decisiva



Envio de **ofício formal unificado**, consolidando todas as reivindicações e definindo os termos para a resolução do contrato.

Demandas Chave

- Solicitação final para o reequilíbrio de preços.
- Comunicação da **paralisação imediata** dos serviços remanescentes.
- Proposta de **rescisão amigável** do contrato, condicionada ao acerto dos valores devidos.

Etapa 6: A Via Judicial



Caso a notificação não resulte em uma negociação favorável dentro de um prazo pré-definido, a estratégia prevê a **judicialização imediata** da questão.

Esta ação não é um último recurso, mas a conclusão planejada de nossa estratégia.

A robusta documentação técnica e processual construída nas etapas anteriores servirá como a base para uma ação judicial forte e com altas chances de êxito para resguardar os direitos da Lavoro e recuperar os valores devidos.
